

فضاهای آموزشی و کمک آموزشی
(در جریان ساخت - تکمیل شده)


۸۴-۸۶

پروژه های عمرانی دانشگاه

ردیف	عنوان پروژه	سال شروع	سال خاتمه	متراژ زیربنا (متر مربع)	اعتبار (مبالغ به میلیون ریال)	محل تامین اعتبار	درصد پیشرفت کار
۱	احداث ساختمان فنی و مهندسی	۸۳	۸۶	۱۰۰۰۰	۳۷۰۰۰	سایر منابع	۱۰۰
۲	احداث ساختمان دانشکده علوم اداری و اقتصاد	۸۶	۸۸	۹۰۰۰	۴۵۰۰۰	سایر منابع	۵۰
۳	احداث ساختمان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی	۸۶	۸۸	۱۵۰۰۰	۷۶۰۰۰	سایر منابع	۴۰
۴	احداث ساختمان دانشکده آمار و ریاضی	۸۶	۸۸	۹۰۰۰	۴۵۰۰۰	سایر منابع	۵۵
۵	احداث ساختمان دانشکده زیست شناسی و زمین شناسی	۸۶	۸۸	۸۸۰۰	۴۰۰۰۰	سایر منابع	۲۵
۶	احداث ساختمان حوزه معاونت آموزشی	۸۵	۸۶	۳۵۰۰	۱۵۰۰۰	سایر منابع	۱۰۰
۷	احداث ساختمان سلف سرویس	۸۵	۸۷	۴۲۰۰	۱۴۰۰۰	بودجه عمومی - سایر منابع	۸۵
۸	ساختمان خوابگاه خارجی ها	۸۵	۸۶	۳۵۰۰	۴۰۰۰	سایر منابع	۱۰۰
۹	تکمیل سالن آمفی تئاتر	۸۴	۸۵	۲۳۰۰	۴۰۰۰	بودجه عمومی - سایر منابع	۱۰۰
۱۰	تغییر کاربری کتابخانه مرکزی	۸۴	۸۵	۱۲۰۰	۳۰۰۰	بودجه عمومی - سایر منابع	۱۰۰
۱۱	احداث استخر و سونا	۸۵	۸۶	۱۱۰۰	۳۵۰۰	سایر منابع	۱۰۰
۱۲	احداث ساختمان خوابگاه متاهلین	۸۴	۸۷	۴۰۰۰	۱۵۵۰۰	سایر منابع	۴۰
۱۳	احداث سالن ورزشی حجاب	۸۵	۸۶	۳۰۰۰	۷۰۰۰	سایر منابع	۱۰۰
۱۴	ورزشگاه بین المللی دانشگاه	۸۶	۸۷	۷۰۰۰	۴۰۰۰۰	سایر منابع	۳۳
۱۵	محوطه سازی و تاسیسات زیربنایی	۸۵	۸۷	-	۱۷۸۱۶	بودجه عمومی - سایر منابع	۷۵
۱۶	بنای شهر موزه	۸۶	۸۹	۲۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰	سایر منابع	۵
۱۷	آزمایشگاه دانشکده مهندسی	۸۴	۸۶	۱۸۰۰	۸۱۰۰	سایر منابع	۱۰۰

فضاهای در جریان ساخت آموزشی و کمک آموزشی

۸۴-۸۶

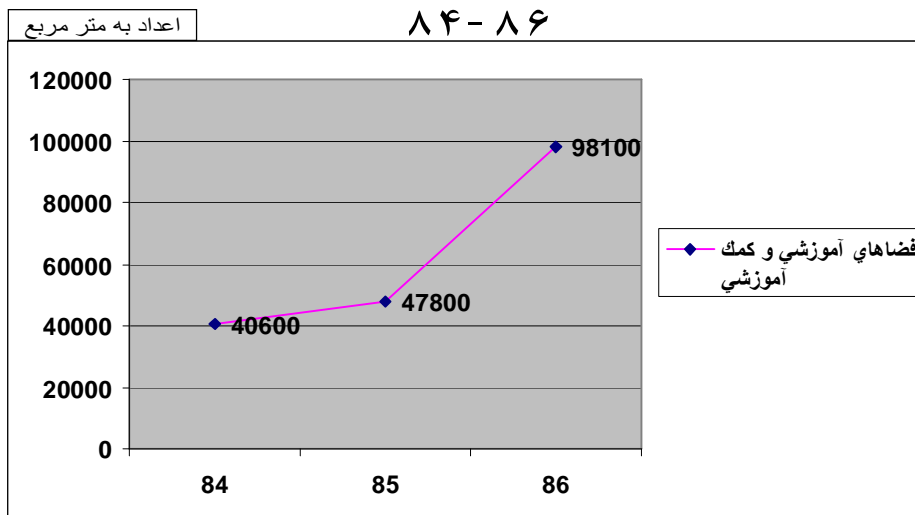


پروژه های عمرانی در جریان ساخت

ردیف	عنوان پروژه	سال شروع	سال خاتمه	متراژ زیربنا (متر مربع)	اعتبار (مبالغ به میلیون ریال)	محل تامین اعتبار	درصد پیشرفت کار
۱	احداث ساختمان دانشکده علوم اداری و اقتصاد	۸۶	۸۸	۹۰۰۰	۴۵۰۰۰	سایر منابع	۵۰
۲	احداث ساختمان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی	۸۶	۸۸	۱۵۰۰۰	۷۶۰۰۰	سایر منابع	۴۰
۳	احداث ساختمان دانشکده آمار و ریاضی	۸۶	۸۸	۹۰۰۰	۴۵۰۰۰	سایر منابع	۵۵
۴	احداث ساختمان دانشکده زیست شناسی و زمین شناسی	۸۶	۸۸	۸۸۰۰	۴۰۰۰۰	سایر منابع	۲۵
۵	احداث ساختمان سلف سرویس	۸۵	۸۷	۴۲۰۰	۱۴۰۰۰	بودجه عمومی سایر منابع	۸۵
۶	احداث ساختمان خوابگاه متاهلین	۸۴	۸۷	۴۰۰۰	۱۵۵۰۰	سایر منابع	۴۰
۷	ورزشگاه بین المللی دانشگاه	۸۶	۸۷	۷۰۰۰	۴۰۰۰۰	سایر منابع	۳۳
۸	محوطه سازی و تاسیسات زیربنایی	۸۵	۸۷	-	۱۷۸۱۶	بودجه عمومی سایر منابع	۷۵
۹	بنای شهر موزه	۸۶	۸۹	۲۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰	سایر منابع	۵


فضای در جریان ساخت آموزشی

۸۴-۸۶

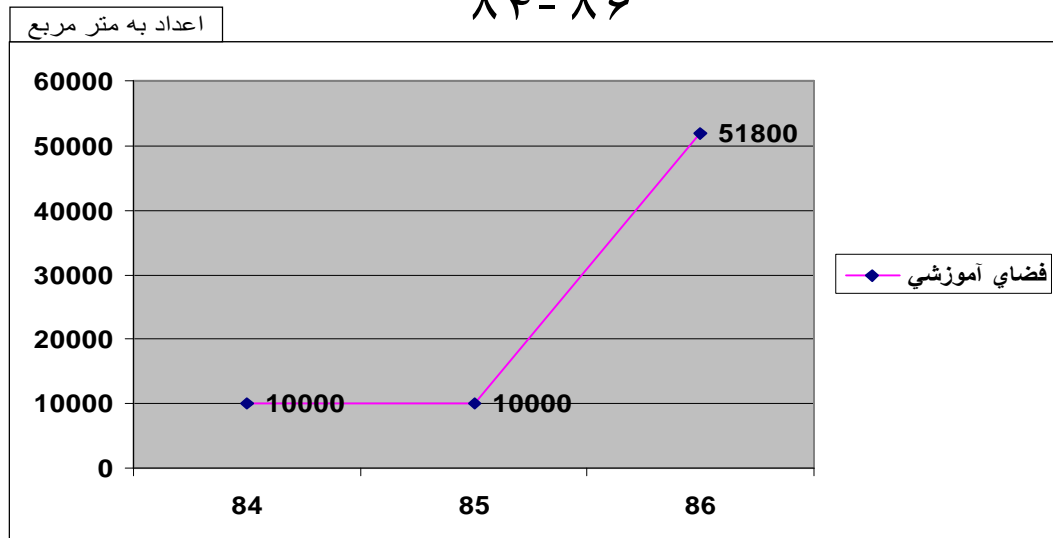


فضای در جریان ساخت کمک آموزشی

۸۴-۸۶

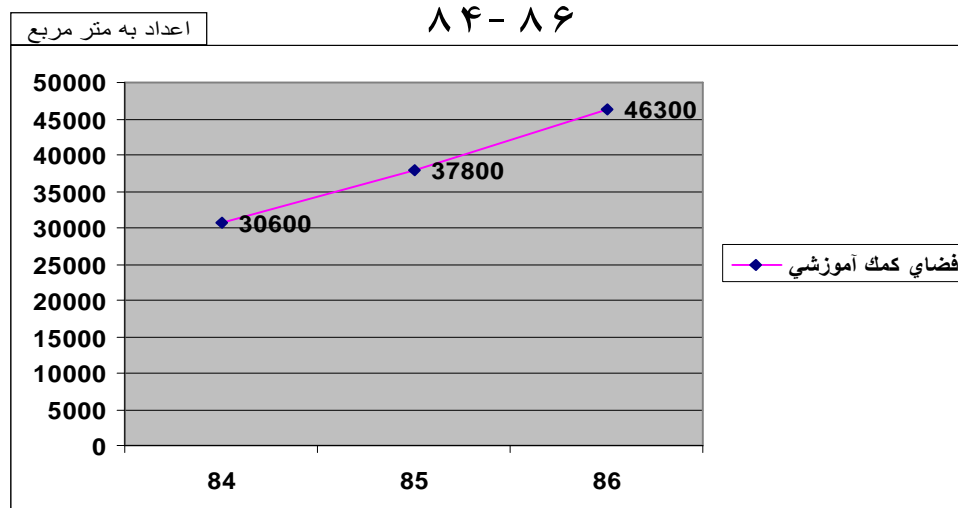


فضای در جریان ساخت کمک آموزشی

۸۴-۸۶

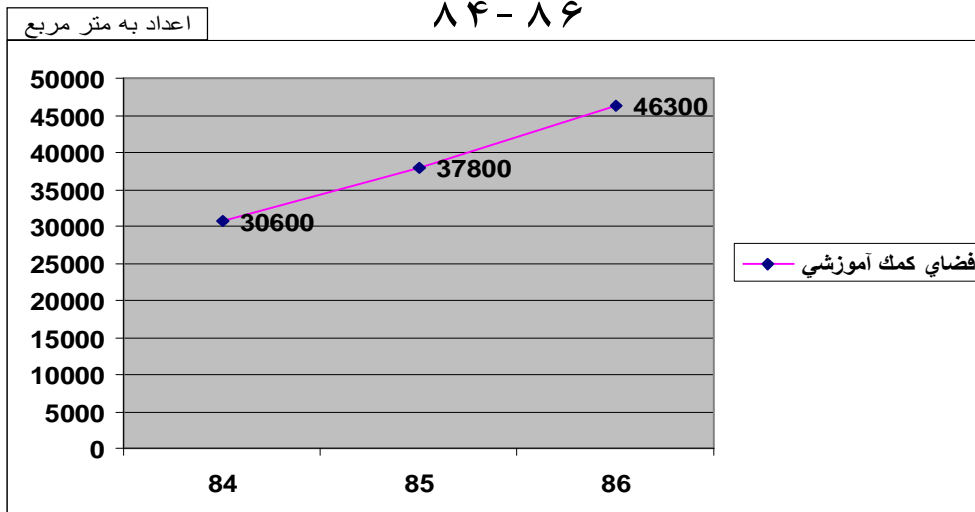

فضاهای آموزشی و کمک آموزشی تکمیل شده

۸۴-۸۶

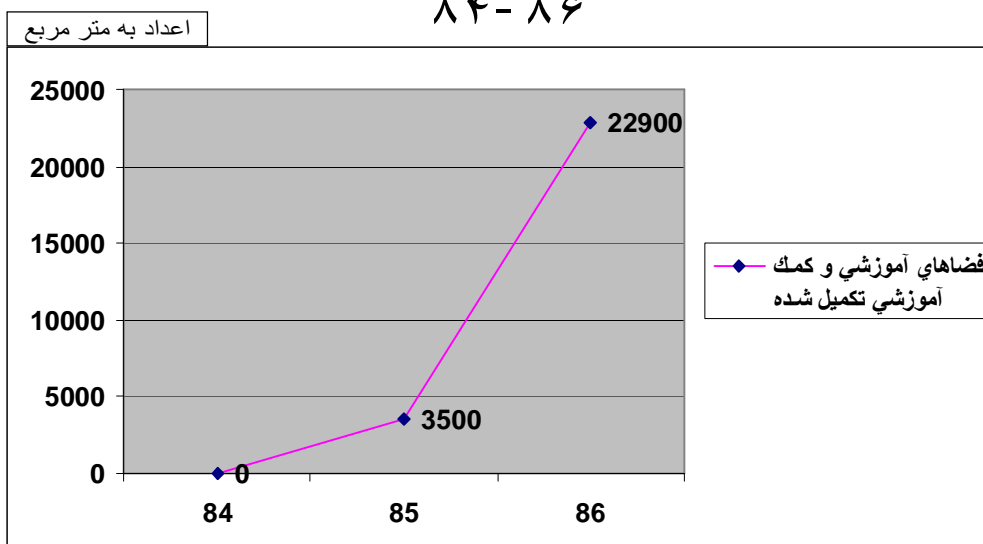


پروژه های عمرانی تکمیل شده

ردی ف	عنوان پروژه	سال شروع	سال خاتمه	متراژ زیربنای (متر مربع)	اعتبار (مبالغ به میلیون ریال)	محل تامین اعتبار	درصد پیشرفت کار
۱	ساختمان فنی و مهندسی	۸۳	۸۶	۱۰۰۰۰	۳۷۰۰۰	سایر منابع	۱۰۰
۲	ساختمان خوابگاه خارجی ها	۸۵	۸۶	۳۵۰۰	۴۰۰۰	سایر منابع	۱۰۰
۳	احداث ساختمان حوزه معاونت آموزشی	۸۵	۸۶	۳۵۰۰	۱۵۰۰۰	سایر منابع	۱۰۰
۴	تکمیل سالن آمفی تئاتر	۸۴	۸۵	۲۳۰۰	۴۰۰۰	بودجه عمومی سایر منابع	۱۰۰
۵	تغییر کاربری کتابخانه مرکزی	۸۴	۸۵	۱۲۰۰	۳۰۰۰	بودجه عمومی سایر منابع	۱۰۰
۶	احداث استخر و سونا	۸۵	۸۶	۱۱۰۰	۳۵۰۰	سایر منابع	۱۰۰
۷	احداث سالن ورزشی حجاب	۸۵	۸۶	۳۰۰۰	۷۰۰۰	سایر منابع	۱۰۰
۸	آزمایشگاه الکترونیک دانشکده مهندسی	۸۴	۸۶	۱۸۰۰	۸۱۰۰	سایر منابع	۱۰۰


فضای تکمیل شده آموزشی

۸۴-۸۶

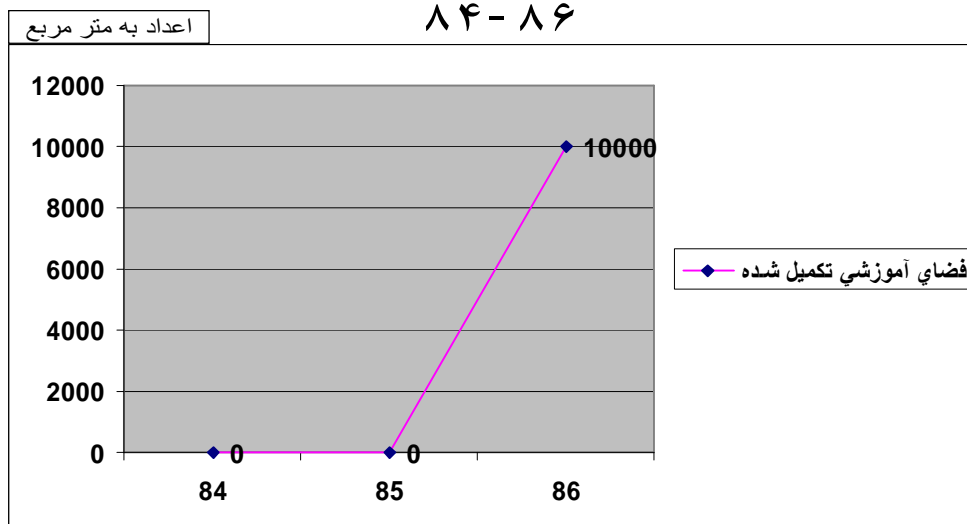

فضای تکمیل شده کمک آموزشی

۸۴-۸۶

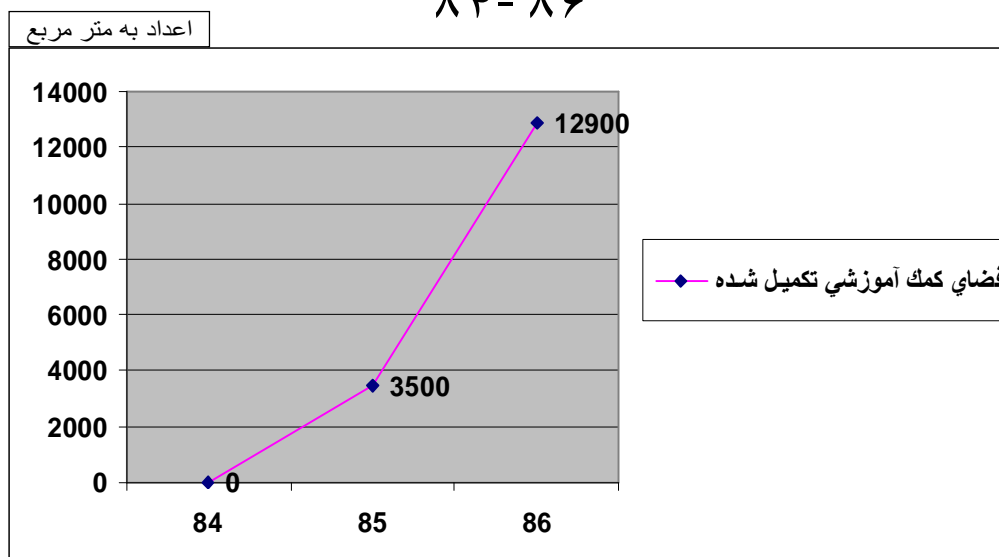

دانشکده فنی و مهندسی



ساختمان خوابگاه خارجی ها



حوزه معاونت آموزشی



سالن آمفی تئاتر



تکمیل طبقه ششم کتابخانه مرکزی



استخر و سونا



دانشکده علوم اداری و اقتصاد



دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی



دانشکده آمار و ریاضی



دانشکده زیست شناسی و زمین شناسی



ساختمان سلف سرویس



خوابگاه متاهلین



ورزشگاه بین المللی



محوطه سازی و تاسیسات زیربنائی



بنای شهر موزه

